



Úvod – IOP Terezín



Příjemce dotace : Terezín, město změny, z.s.p.o.
(50% Ústecký Kraj, 50% Město Terezín)

Rozhodnutí o poskytnutí dotace podpis 4.5.2010.

Původní Termín ukončení realizace projektu 31.12.2013.

Nový termín ukončení realizace projektu 31.12.2014

Celková výše dotace 499 336 800,- Kč.
Vyčerpáno cca 215 600 000,- Kč

Popis projektu



Předmětem projektu je vzorová památková obnova pěti ohrožených objektů pevnostního města Terezín:

- Kavalír II
- Retranchement 5
- Okolí staveb
- Jízdárna
- Dělostřelecká kasárna

Vybrané stavby, jež jsou zásadní svým významem a potenciálem, budou obnoveny a restaurovány pro nové kulturně-vzdělávací využití.

Partneři projektu




- Město Terezín
- Nadační fond Leo Baecka
- KVH – Pevnost Terezín
- Občanské sdružení přátel historie města Terezín

Realizace projektu



Předmětem projektu je revitalizace pěti objektů:

Kavalír II.	VŘ 004 + VŘ 005	Zrealizováno
Retranchement 5	VŘ 006	V realizaci
Okolí staveb	VŘ 009	V realizaci
Jízdárna	VŘ 008	V realizaci
Dělostřelecká kasárna	VŘ 009	příprava nového VŘ

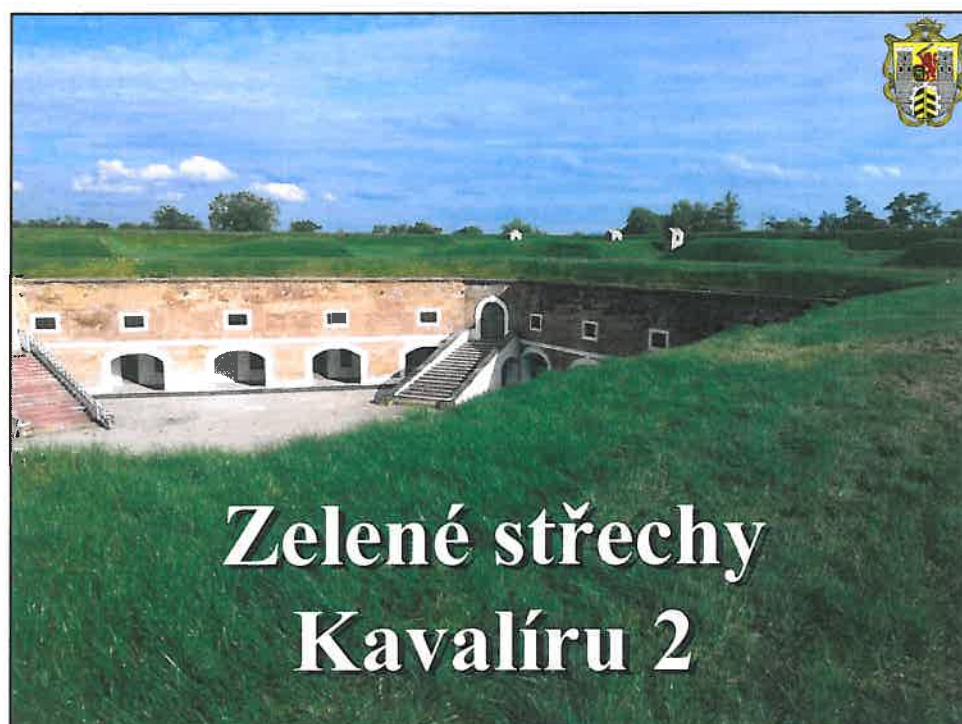

Zelené střechy Kavalíru 2

Předpokládaná hodnota	24 201 680 Kč
Vysoutěžená cena	21 186 825 Kč
Aktuální stav	zrealizováno
Zahájení prací	5.4.2011
Ukončení prací	31.10.2011

Zelené střechy Kavalíru 2

Využití

Partner – Občanské sdružení přátel historie města Terezín	Aktivita – Ukázky ze života a důstojníků a vojáků pevnosti.
--	--



Kavalír 2 - objekt

Předpokládaná hodnota	51 458 824 Kč
Vysoutěžená cena	37 338 602 Kč
Aktuální stav	kolaudace
Zahájení prací	14.7.2011
Ukončení prací	12.7.2012

Kavalír 2



Využití

Partner -

Město Terezín

Občanské sdružení
Přátel historie
města Terezín

Aktivita -

Dělostřelecké muzeum včetně
výstavních exponátů

Semináře na téma propojení
historie s dějinami vzniku
pevnosti Terezín

Retranchement 5



Předpokládaná hodnota 99 438 655 Kč

Vysoutěžená cena 97 139 610 Kč

Aktuální stav **v realizaci**

Zahájení prací 19.7.2012

Ukončení prací 30.11.2013

Retranchement 5



Využití

Partner – KVH – Pevnost Terezín	Aktivita – Centrum dokumentace obnovy a využití vojenských pevnostních systémů
Občanské sdružení přátel historie města Terezín	Vybudování stálé expozice dobové strážnice, ukázkové akce života vojáků i prostého obyvatelstva v 18 století



Jízdárna



Předpokládaná hodnota	47 253 781 Kč
Vysoutěžená cena	44 903 113 Kč
Aktuální stav	v realizaci
Zahájení prací	7.1.2013
Ukončení prací	20.12.2013

Jízdárna



Využití

Partner -

Klub vojenské historie

Občanské sdružení přátel historie města Terezín

Aktivita -

Nácvik vojenských formací v dobových uniformách.

Nácvik formací dobového jezdeckva, vybudování expozice života ve vojenském táboře.

Okolí staveb



Předpokládaná hodnota	36 375 957 Kč
Vysoutěžená cena	32 992 029 Kč
Aktuální stav	v realizaci
Zahájení prací	2.1.2013
Ukončení prací	30.10.2013

Dělostřelecká kasárna



Dělostřelecká kasárna



Předpokládaná hodnota 150 290 420 Kč

Aktuální stav

příprava VŘ

Zahájení prací

předpoklad 30.9.2013

Ukončení prací

17.11.2014

VŘ bude zrušeno na základě doporučení Ministerstva Kultury ČR a opětovně vypsáno.

Dělostřelecká kasárna



Využití

Partner –

Nadační fond Leo
Baecka

Občanské sdružení
přátel historie
města Terezín

Aktivita –

Speciální vzdělávání a
rekvalifikace v oblasti
prevence proti xenofobii,
rasismu, násilí a politickému
extremismu.

Vytvoření muzea s následnými
odbornými prohlídkami
obyčejných lidí z 18 století

VŘ 012 - Mobiliář



Předpokládaná hodnota 24 272 269 Kč

VŘ zahájeno 30.3.2012

VŘ ukončeno 12.9.2012

Aktuální stav **příprava nového VŘ**

VŘ bylo zrušeno z důvodu nesplnění kvalifikace ani jedním z uchazečů. Výběrové řízení bude vypsáno opětovně.

Kontroly projektu



Kontrola PAS

Auditní tým konstatoval, že:

Operace se provádí v souladu s podmínkami dotace a splňují všechny související podmínky. Vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy. Výdaje jsou v souladu s vnitrostátními předpisy a předpisy ES.

Kontrola NKÚ

Kontrolou NKÚ nebylo shledáno žádné závažné pochybení a nebyla uložena žádná opatření viz. protokol o kontrole č. 12/02.

Audit účetnictví

Ověření účetní závěrky auditorem

Závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv a výsledků hospodaření za rok 2011, 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Vize postupu v projektu v r. 2013

- Dokončení staveb v plánovaných termínech
- Úspěšný výběr dodavatele stavby Dělostřelecká kasárna a dodavatele mobiliáře.
- Příprava k zahájení provozní fáze projektu za pomoci partnerů projektu
- Urychlení předávání dokončovaných objektů partnerům.
- Zahájení činnosti dělostřeleckého muzea v objektu K2.
- Zrychlené proplácení faktur dodavatelům díky přednastaveným limitkám

Děkuji za pozornost

Ing. Miloš Malý

Číslo projektu: CZ.1.06/5.1.00/01.0/156
